

**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

# **RELATÓRIO DE STATUS DE OBRAS – PERÍODO SETEMBRO/2021 ATÉ JULHO/2022**

## **1. INFORMAÇÕES GERAIS**

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nº. 299, Vila Regina, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.392.459/0001-03, apresenta relatório de status de obras de engenharia com o objetivo de informar ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) a respeito do andamento das obras realizadas ou fiscalizadas pela METROBUS.

## **2. OBRAS DE ENGENHARIA EXECUTADAS**

### **2.1. EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E/OU REFORÇO EM PILARES E VIGAS DO TERMINAL NOVO MUNDO**

#### **2.1.1. Objeto**

Contratação de empresa de Engenharia especializada em Execução de Recuperação e Reforço dos pilares e vigas, pelo prazo de seis meses.

#### **2.1.2. Especificações**

Execução de recuperação e/ou reforço estrutural de todos os 42 pilares e vigas do Terminal Novo Mundo, de acordo com os procedimentos executivos e especificações de materiais do Projeto de Recuperação Estrutural elaborado pela Empresa Hirata e Associados Consultoria e Projetos Estruturais, registrado com a ART nº 1020210165767.

#### **2.1.3. Informações gerais**

Processo: 202100368

Pregão: 099/2021

Valor orçado: R\$ 486.488,87

Contrato: Nº 118/2021


Contratada: CE Construenergia Construções e Montagens

CNPJ: 35.615.924/0001-87

Valor do contrato: R\$ 401.653,64

Status: **Concluída.**

#### 2.1.4. Relatório fotográfico

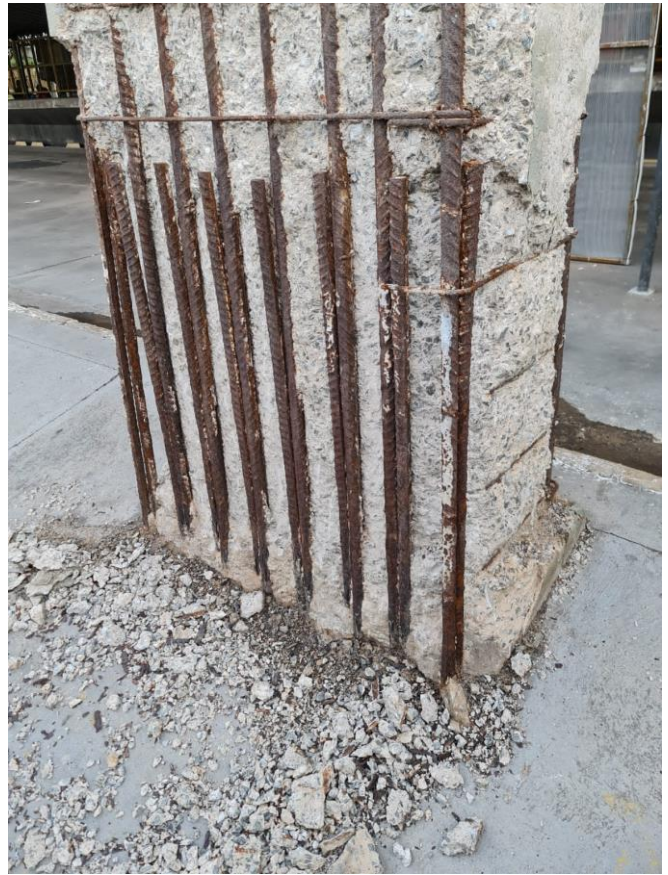

Amostra de pilar e viga com estrutura comprometida



Amostra de um pilar com estrutura comprometida



Amostra de pilar em execução de recuperação e reforço estrutural



Vista antes e depois de pilar e viga após execução de recuperação e reforço estrutural.

## **2.2. EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE GRADIS DO EIXO ANHANGUERA**

### **2.2.1. Objeto**

Contratação de empresa especializada para restauração de toda a grade de proteção e a substituição das partes danificadas do corpo do gradil no perímetro do Eixo Anhanguera, incluso todo material necessário para a obra.

### **2.2.2. Especificações**

Execução de restauração de toda a grade de proteção e a substituição das partes danificadas do corpo do gradil no perímetro do Eixo Anhanguera, reposição dos artefatos de concreto e pintura dos gradis e guias.

### **2.2.3. Informações gerais**

Processo: 202100338

Pregão: 081/2021

Valor orçado: R\$ 486.488,87

Contrato: Nº 105/2021

Contratada: LC Tendas Eireli

CNPJ: 35.067.125/0001-13

Valor do contrato: R\$ 398.733,26

Status: **Concluída.**

#### 2.2.4. Relatório fotográfico



Vista de ponto do Eixo Anhanguera com Gradil danificado



Vista de ponto do Eixo Anhanguera com Gradil danificado



Vista antes e depois de execução de instalação de gradil no Eixo Anhanguera.



Amostra de artefato de concreto danificado e guia de concreto em falta.



Amostra de guia de concreto instalada.





Amostra de artefato de concreto instalado.



Amostra de artefato de concreto instalado e guias do eixo pintadas.



Amostra geral de gradil instalado e pintado, bem como artefatos de concreto e guias instaladas e pintadas.

## **2.3. EXECUÇÃO DE HUMANIZAÇÃO DO TERMINAL PADRE PELÁGIO**

### **2.3.1. Objeto**

Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de projeto básico de adequação e humanização do Terminal Padre Pelágio pelo prazo de 180 dias.

### **2.3.2. Especificações**

Execução de projeto básico de adequação e humanização do Terminal Padre Pelágio, com o objetivo de revitalizar a pintura geral das paredes, pilares e estruturas metálicas (sem pintura do telhado), paisagismo e iluminação decorativa, construção de um banheiro PCD, reformas dos banheiros e construção dos bicicletários, descritos e discriminados no Projeto Básico de Adequação e Humanização do Terminal Padre Pelágio e Memorial Descritivo registrado no CREA com a ART nº 1020210204267.

### **2.3.3. Informações gerais**

Processo: 202100053000131

Pregão: 128/2021

Valor orçado: R\$ 395.893,88

Contrato: Nº 152/2021

Contratada: Dual Construtora Eireli

CNPJ: 34.969.646/0001-01

Valor do contrato: R\$ 394.977,78

Status: Em Andamento.

#### 2.3.4. Relatório fotográfico



Vista antes e depois de execução de pintura de corrimão e guarda corpo.



Vista antes e depois de execução de pintura geral e pintura de segurança com demarcação de piso tátil



Vista antes e depois de execução de pintura geral e pintura de segurança com demarcação de piso tátil



Vista antes e depois de execução de pintura geral e implantação de paisagismo



Vista antes e depois de execução de pintura de segurança no guard-rail de proteção do Terminal Padre Pelágio



Vista antes e depois de construção de banheiro PCD no Terminal Padre Pelágio



*Rondinely Rosa Guimarães*

---

**Rondinely Guimarães**  
Coordenação de Infraestrutura  
Engenheiro Civil  
CREA 1015223389 D/GO
