


Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Precedentes	Recursos
0	ATHIS-PADRAO 1-100UH-R00	88 dias	Seg 05/07/21	Seg 08/11/21		
1	LOTE 1	17 dias	Seg 05/07/21	Ter 27/07/21		
2	REUNIÃO - PARTIDA DE CONTRATO PRIORIDADES	1 dia	Seg 05/07/21	Seg 05/07/21		EATHIS1;GEPROTEC
3	LEVANTAMENTO	10 dias	Ter 06/07/21	Seg 19/07/21	2	EATHIS1
4	ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS E PLANTAS	5 dias	Ter 20/07/21	Seg 26/07/21	3	EATHIS1
5	REUNIÃO - DÚVIDAS	1 dia	Ter 27/07/21	Ter 27/07/21	4	EATHIS1
6	ENTREGA PARCIAL 1	20 dias	Qua 28/07/21	Ter 24/08/21		
7	ELABORAÇÃO DE PROJETO - P 25% - 25UH	12 dias	Qua 28/07/21	Qui 12/08/21	5	EATHIS1
8	ANÁLISE GEPROTEC	4 dias	Sex 13/08/21	Qua 18/08/21	7	GEPROTEC
9	CORREÇÕES	4 dias	Qui 19/08/21	Ter 24/08/21	8	EATHIS1
10	ENTREGA PARCIAL - 25%	0 dias	Ter 24/08/21	Ter 24/08/21	9	EATHIS1
11	ENTREGA PARCIAL 2	25 dias	Sex 13/08/21	Sex 17/09/21		
12	ELABORAÇÃO DE PROJETO - P 25% - 25UH	12 dias	Sex 13/08/21	Seg 06/09/21	7	EATHIS1
13	ANÁLISE GEPROTEC	4 dias	Qua 08/09/21	Seg 13/09/21	12	GEPROTEC
14	CORREÇÕES	4 dias	Ter 14/09/21	Sex 17/09/21	13	EATHIS1
15	ENTREGA PARCIAL - 50%	0 dias	Sex 17/09/21	Sex 17/09/21	14	EATHIS1
16	ENTREGA PARCIAL 3	25 dias	Qua 08/09/21	Qua 13/10/21		
17	ELABORAÇÃO DE PROJETO - P 25% - 25UH	12 dias	Qua 08/09/21	Qui 30/09/21	12	EATHIS1
18	ANÁLISE GEPROTEC	4 dias	Sex 01/10/21	Qua 06/10/21	17	GEPROTEC
19	CORREÇÕES	4 dias	Qui 07/10/21	Qua 13/10/21	18	EATHIS1
20	ENTREGA PARCIAL - 75%	0 dias	Qua 13/10/21	Qua 13/10/21	19	EATHIS1
21	ENTREGA PARCIAL 4	25 dias	Sex 01/10/21	Seg 08/11/21		
22	ELABORAÇÃO DE PROJETO - P 25% - 25UH	12 dias	Sex 01/10/21	Ter 26/10/21	17	EATHIS1
23	ANÁLISE GEPROTEC	4 dias	Qua 27/10/21	Seg 01/11/21	22	GEPROTEC
24	CORREÇÕES	4 dias	Qua 03/11/21	Seg 08/11/21	23	EATHIS1
25	ENTREGA PARCIAL - 100%	0 dias	Seg 08/11/21	Seg 08/11/21	24	EATHIS1

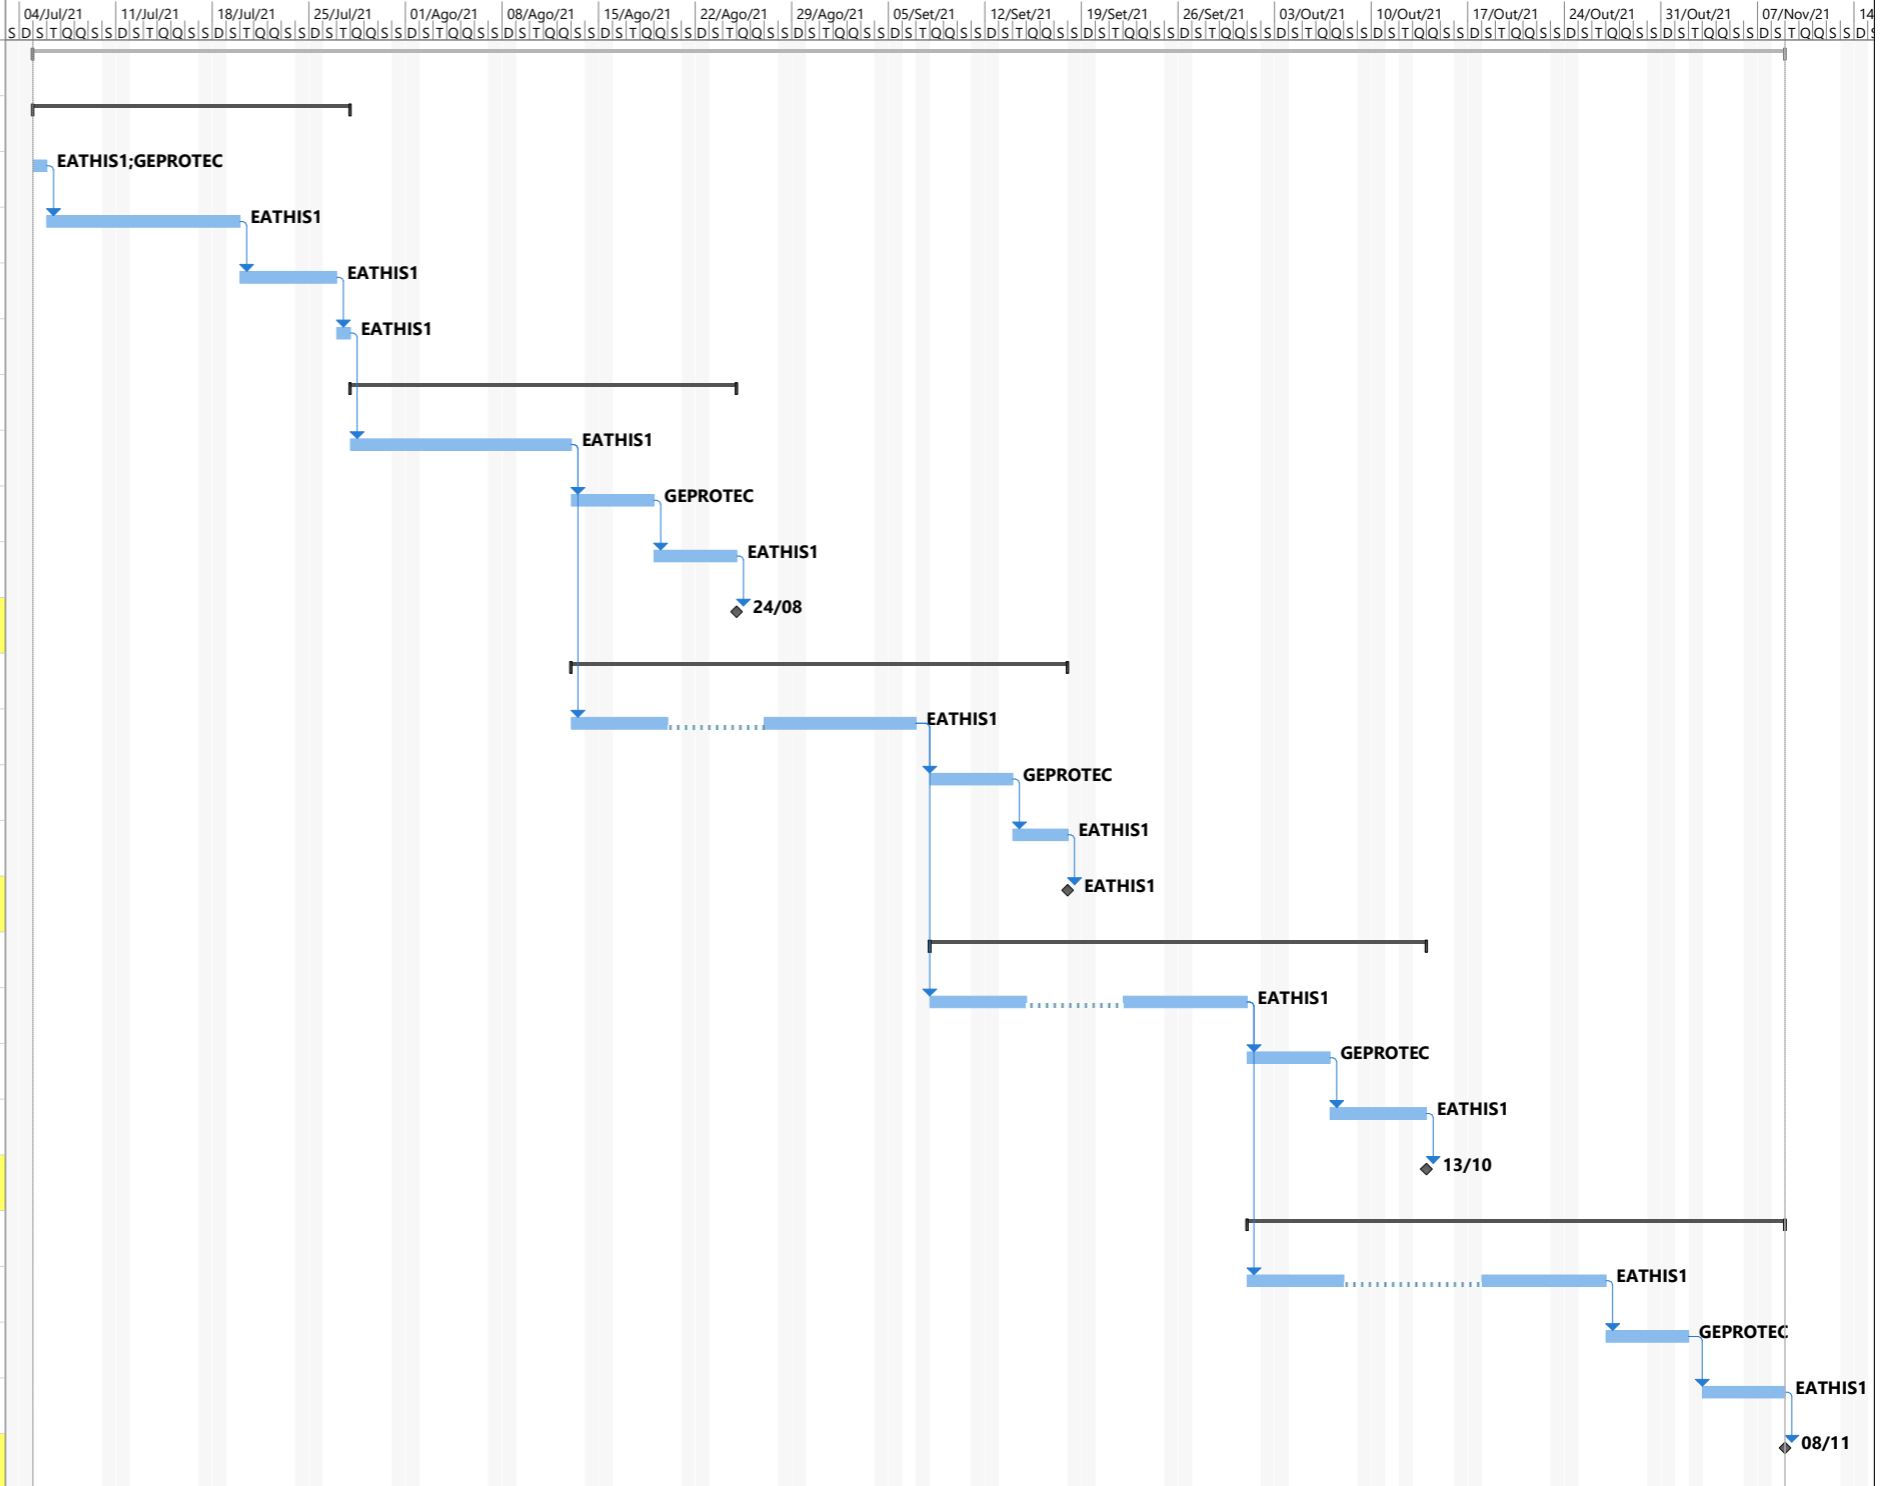

Projeto: ATHIS-PADRAO 1-100UH
Data: Ter 01/06/21

Tarefa		Resumo		Resumo do projeto		Marco Inativo		Resumo Inativo		Tarefa Manual		Somente duração		Somente início		Somente término		Marco externo		Data limite		Andamento		Progresso manual	
Divisão																									
Marco																									
